

Kontroll/fuktmätning

Datum: 2026-07-06

Utförd av: Tony Österman

Fastighet: Fågelvik 1:13

Uppdragsgivare: Kjell & Ina Ununger

Mätresultat

Mätningen är utförd med: Protimeter Surveymaster & Gann Hydromette BL

Uteklimat

RF 45 % temp 18 °C

Risk för tillväxt av mögelsvampar föreligger, om den relativa fuktigheten (RF) i den omgivande luften är över 75 % vilket i furuvirke motsvarar en fuktkvot (FK) på ca 0,17 kg/kg (17 %).

Kritisk fuktkvot för rötsvampstillväxt ligger vid ca > 0,28 kg/kg.


Vind

Fuktkvoten uppmättes till < 8 % i underlagstak och i takstolar i varmvind ovan bastun.

Krypgrund

Fuktkvoten uppmättes till 16,3 % i blindbottenvirke.

Stickprovsmässig mätning har utförts, varför både högre och lägre värde jämfört med de uppmätta kan ha förekommit.

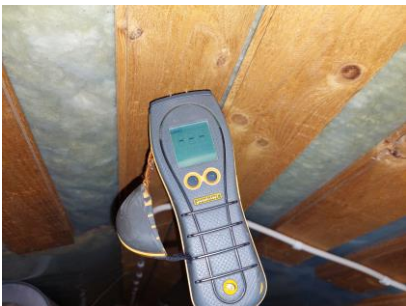

Tony Österman
ostermansbesiktning@gmail.com
072-019 00 36
Östermans Besiktning AB

Fukt- och konstruktionskontroll

Tjänsten fukt- och konstruktionskontroll är ett separat uppdrag och ingår inte i överlåtelsebesiktningsuppdraget. Undersökningen görs främst av de grundkonstruktioner där man erfarenhetsmässigt vet att det kan finnas risk för fuktrelaterade skador. Undersökningen kan också avse andra konstruktioner efter överenskommelse.

Vid en fukt- och konstruktionskontroll utförs vanligtvis punktvisa mätningar, upptagning av 1–2 inspektionshål per konstruktion i syfte att bättre bedöma konstruktionsutförandet och eventuell risk för skada. Uppmätta mätvärden kan variera på olika ställen i byggnaden / konstruktionen och vid olika årstider.

Tjänsten fukt- och konstruktionskontroll är endast en stickprovsmässig kontroll och utgör inte någon fullständig skadeutredning. Utförande av fukt- och konstruktionskontroll ger oftast underlag för en säkrare teknisk bedömning av byggnaden, men kräver att ägaren lämnar sitt medgivande till utförande av eventuella konstruktionsingrepp.
